



Stadt Kenzingen


Umgestaltung der Hauptstraße



**Informationsveranstaltung zum Bauablauf
am 17.04.2019**





Vorstellung der Bauabschnitte und zeitlicher Ablauf

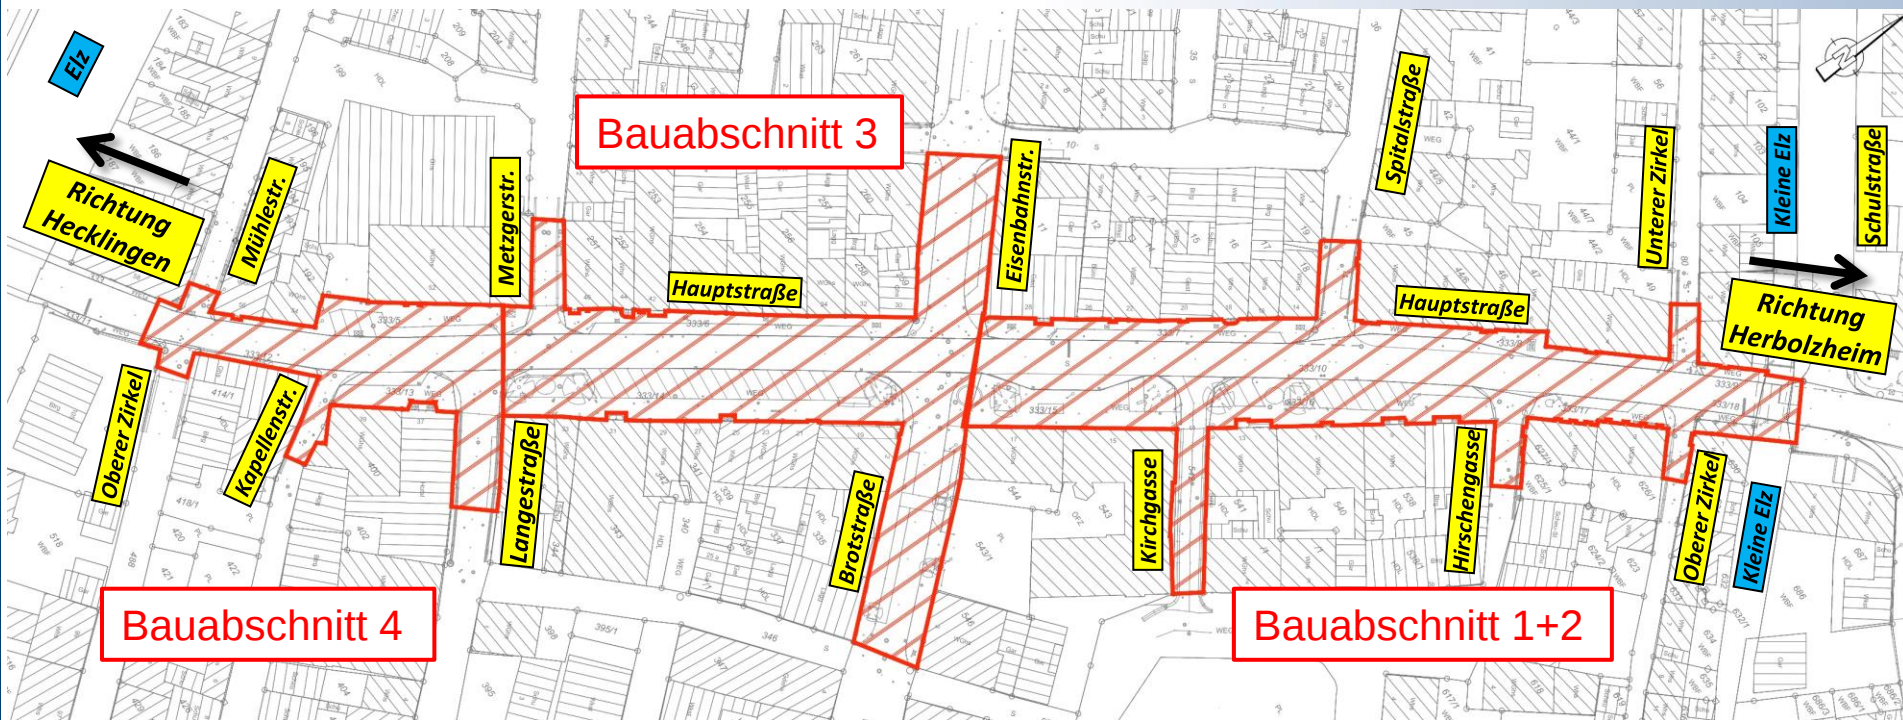




Bauzeitenplan

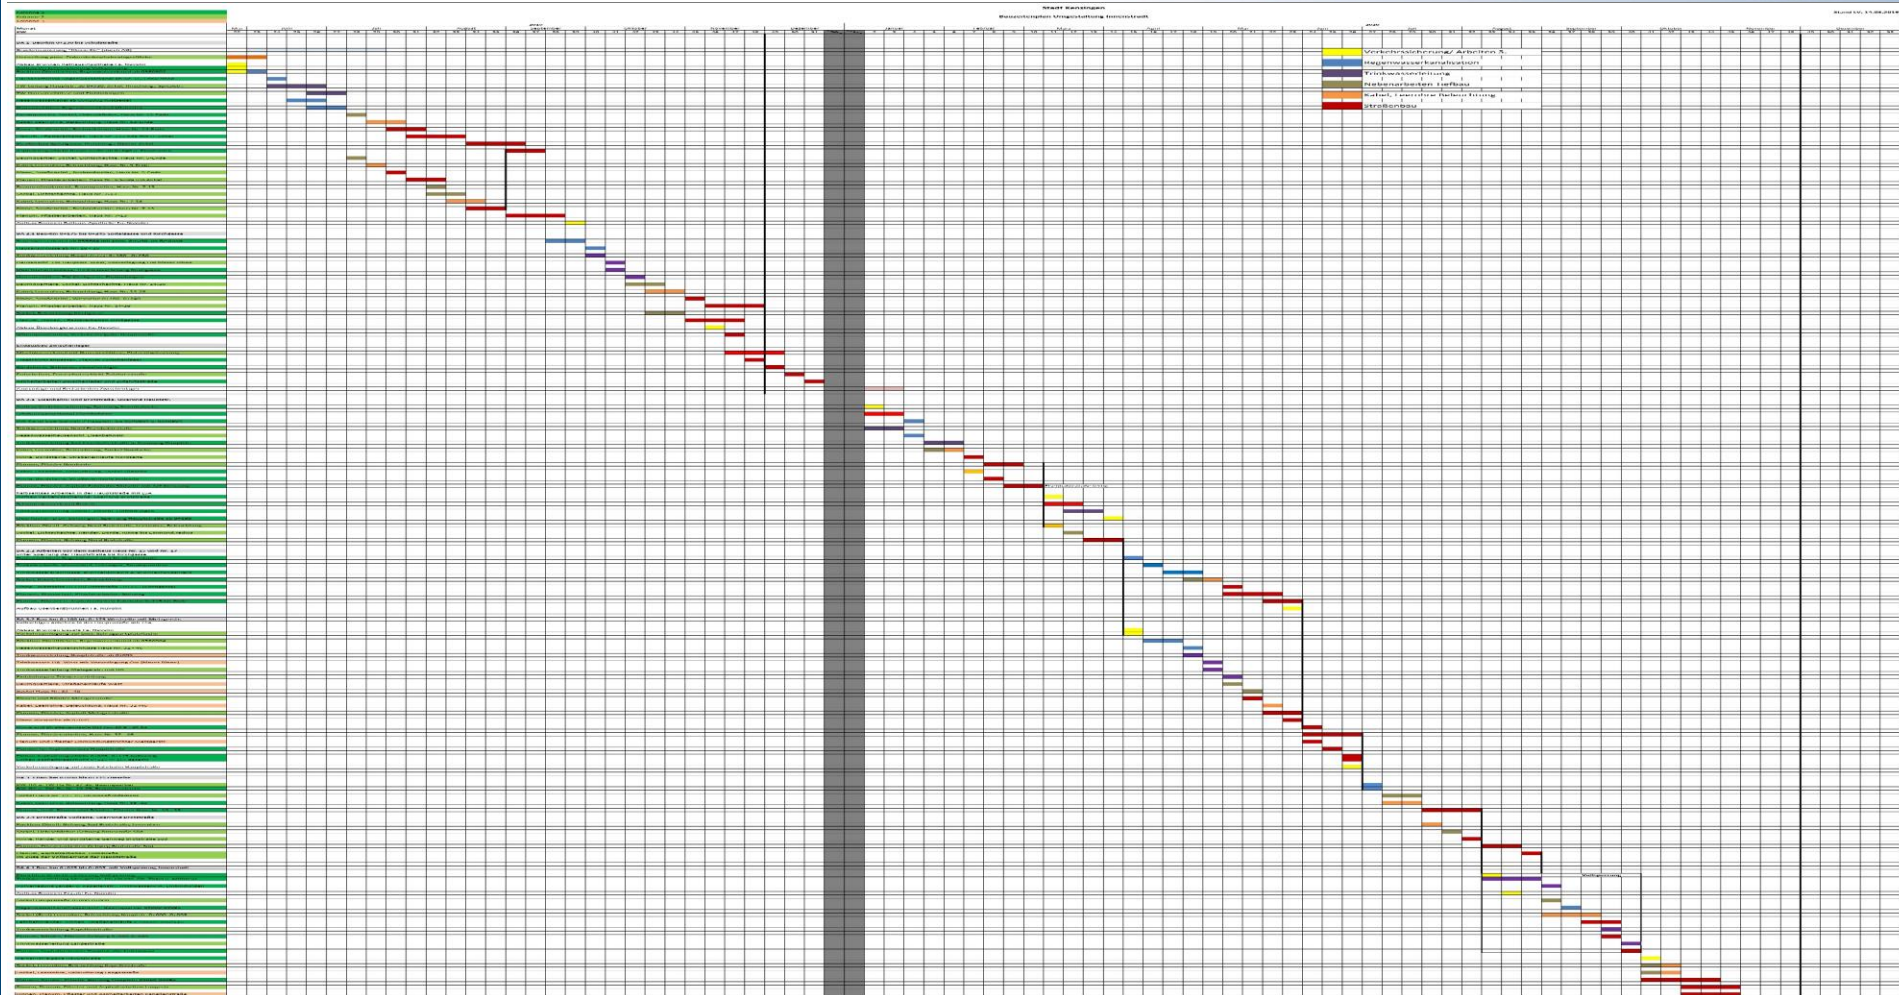

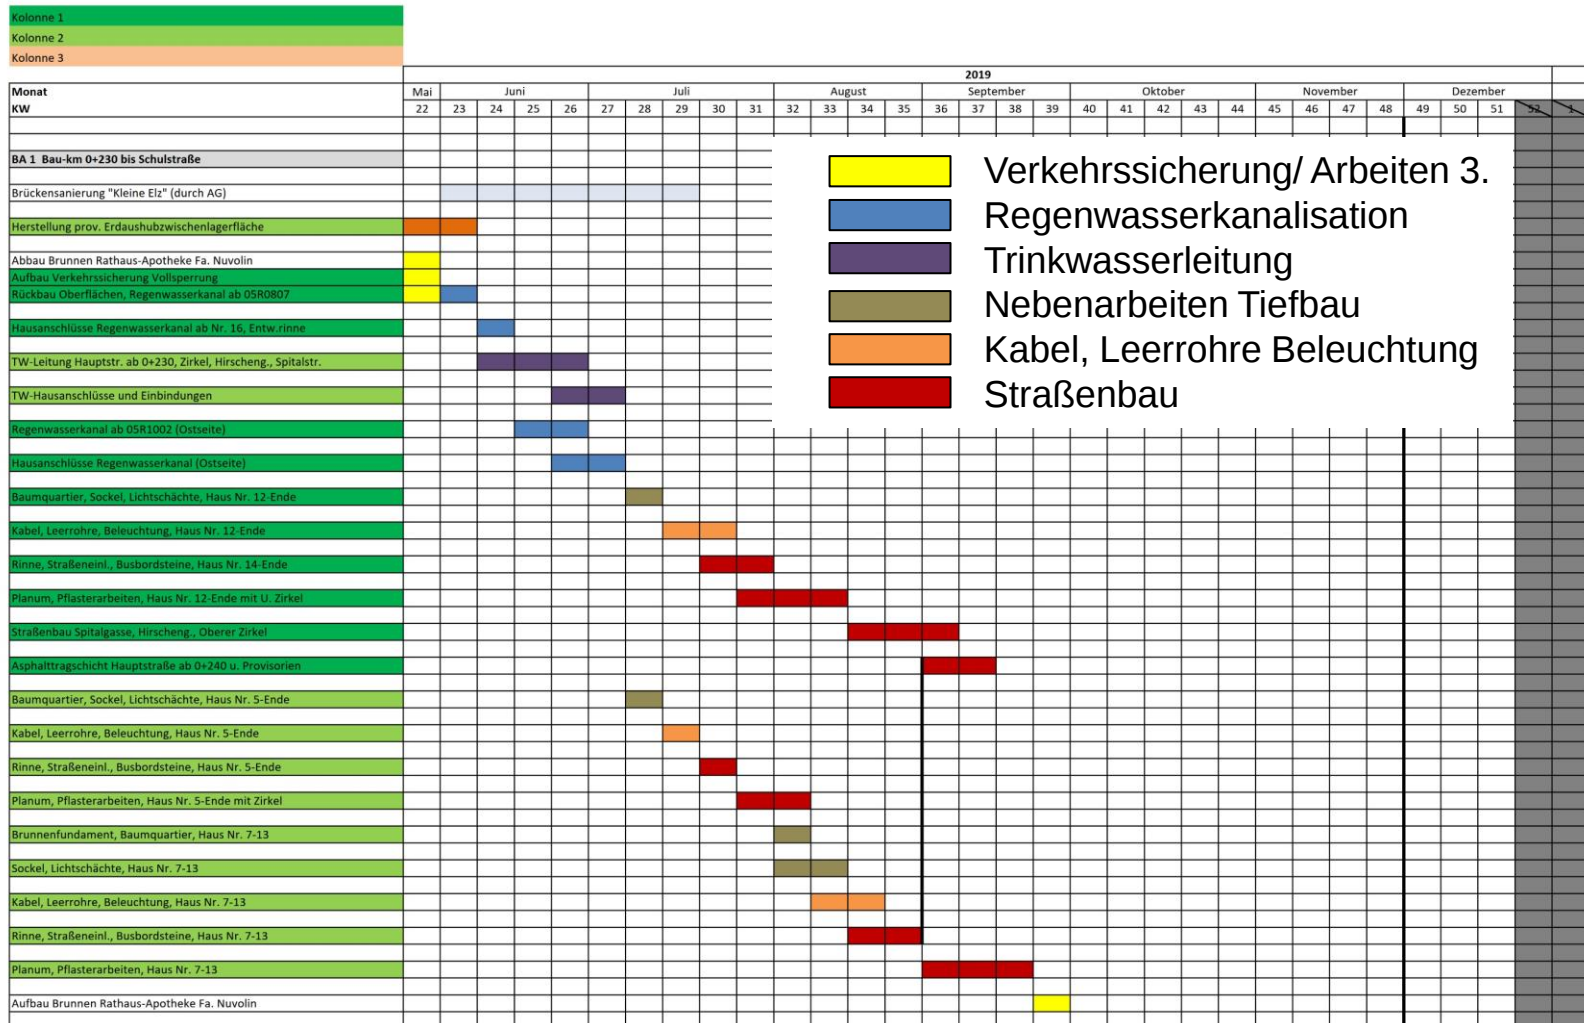



Verkehrsführung

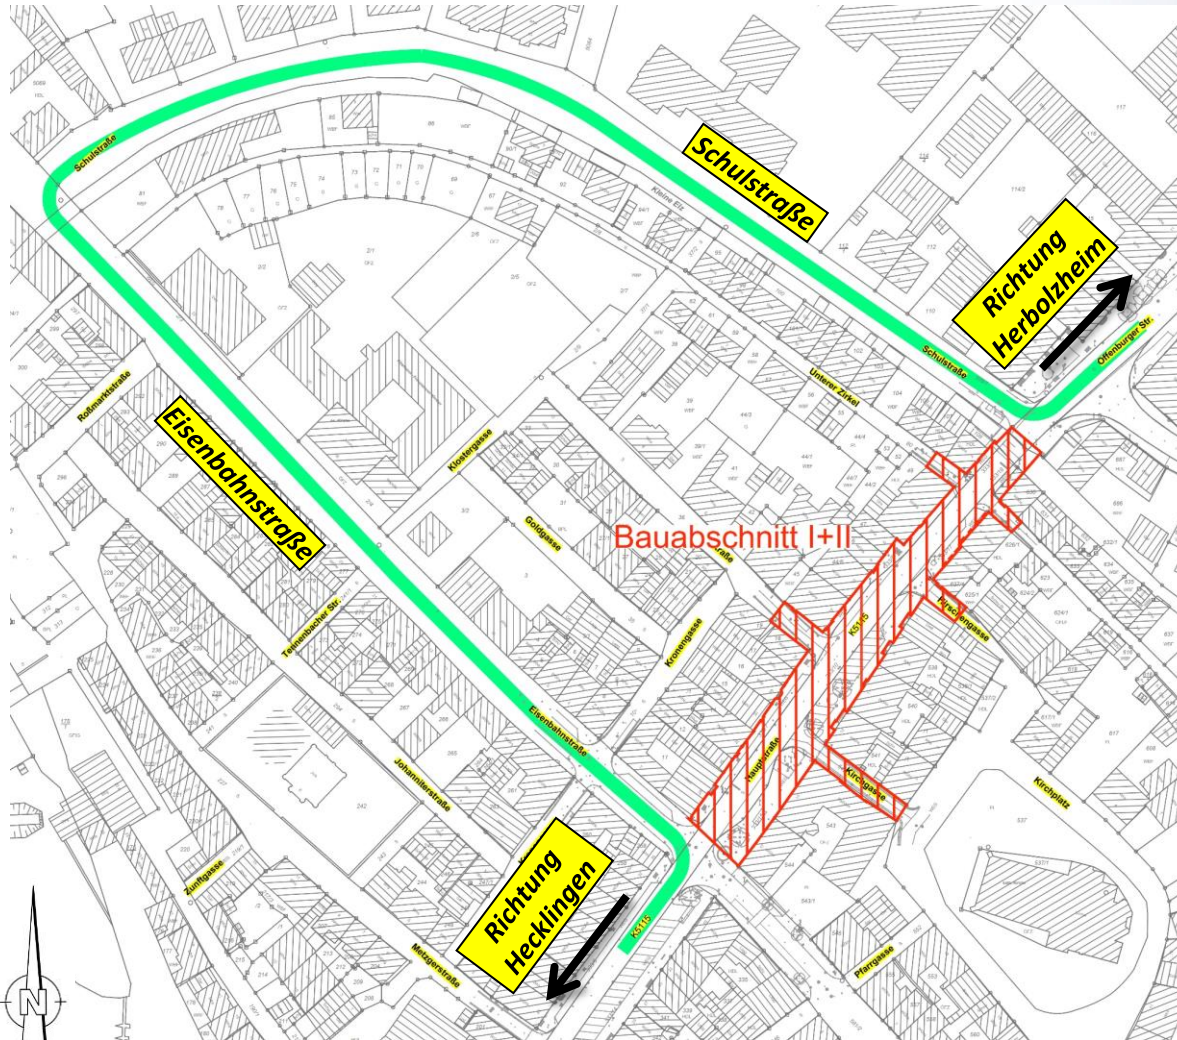

Bauabschnitt 1:


- Brücke „Kleine Elz“ bis kurz vor die Kirchgasse
- Bau unter Vollsperrung
- Umleitung über die Schul- und Eisenbahnstraße

Bauabschnitt 2:

- Kirchgasse bis Eisenbahnstraße
- Bau unter Vollsperrung
- Umleitung über die Schul- und Eisenbahnstraße



Bauabschnitte

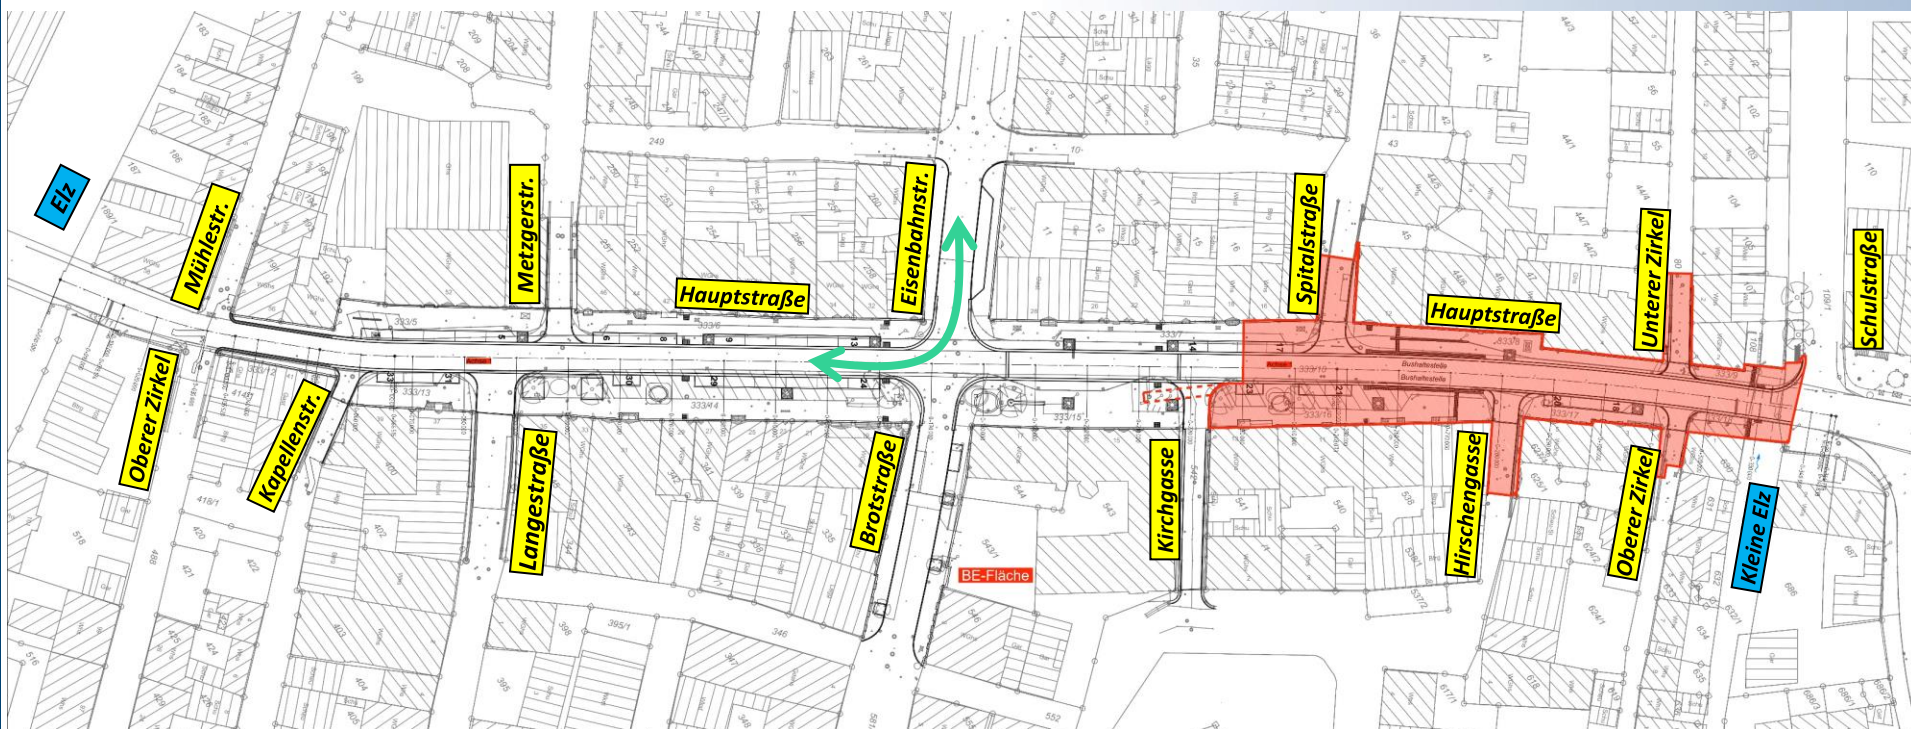


Bauabschnitt 1:

- Ende Mai bis Ende September 2019
(zu Beginn parallel Herstellung prov. Erdaushubzwischenlagerfläche)



Bauabschnitte

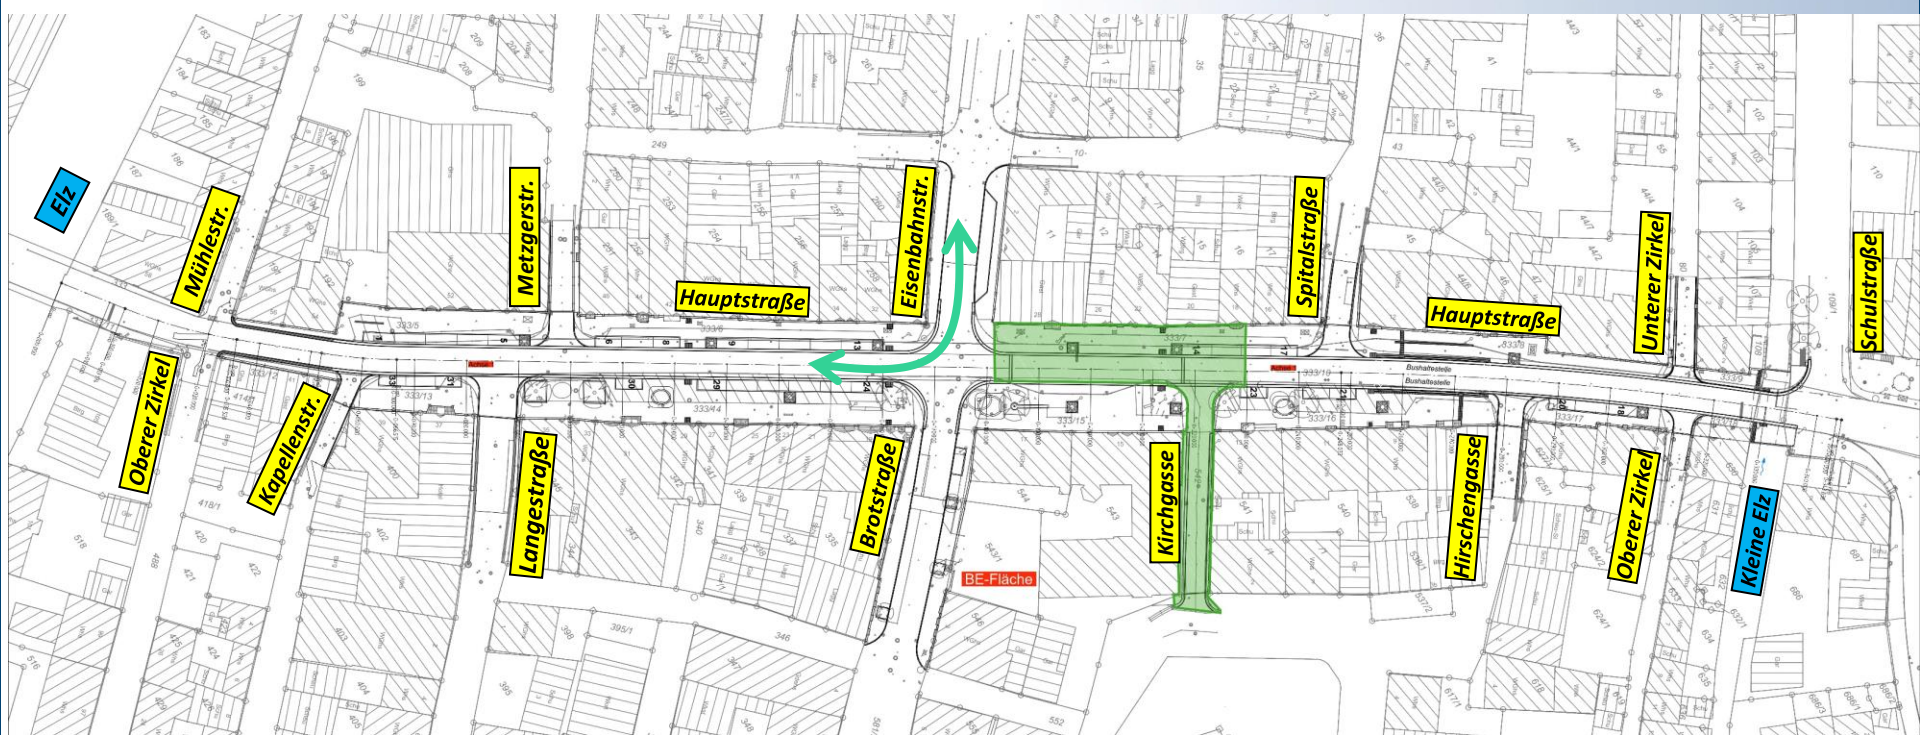


Bauabschnitt 2.1:

- Mitte September bis Ende November 2019
- Dezember Baupause Innenstadt, Endausbau Erdaushubzwischenlagerfläche



Bauabschnitte

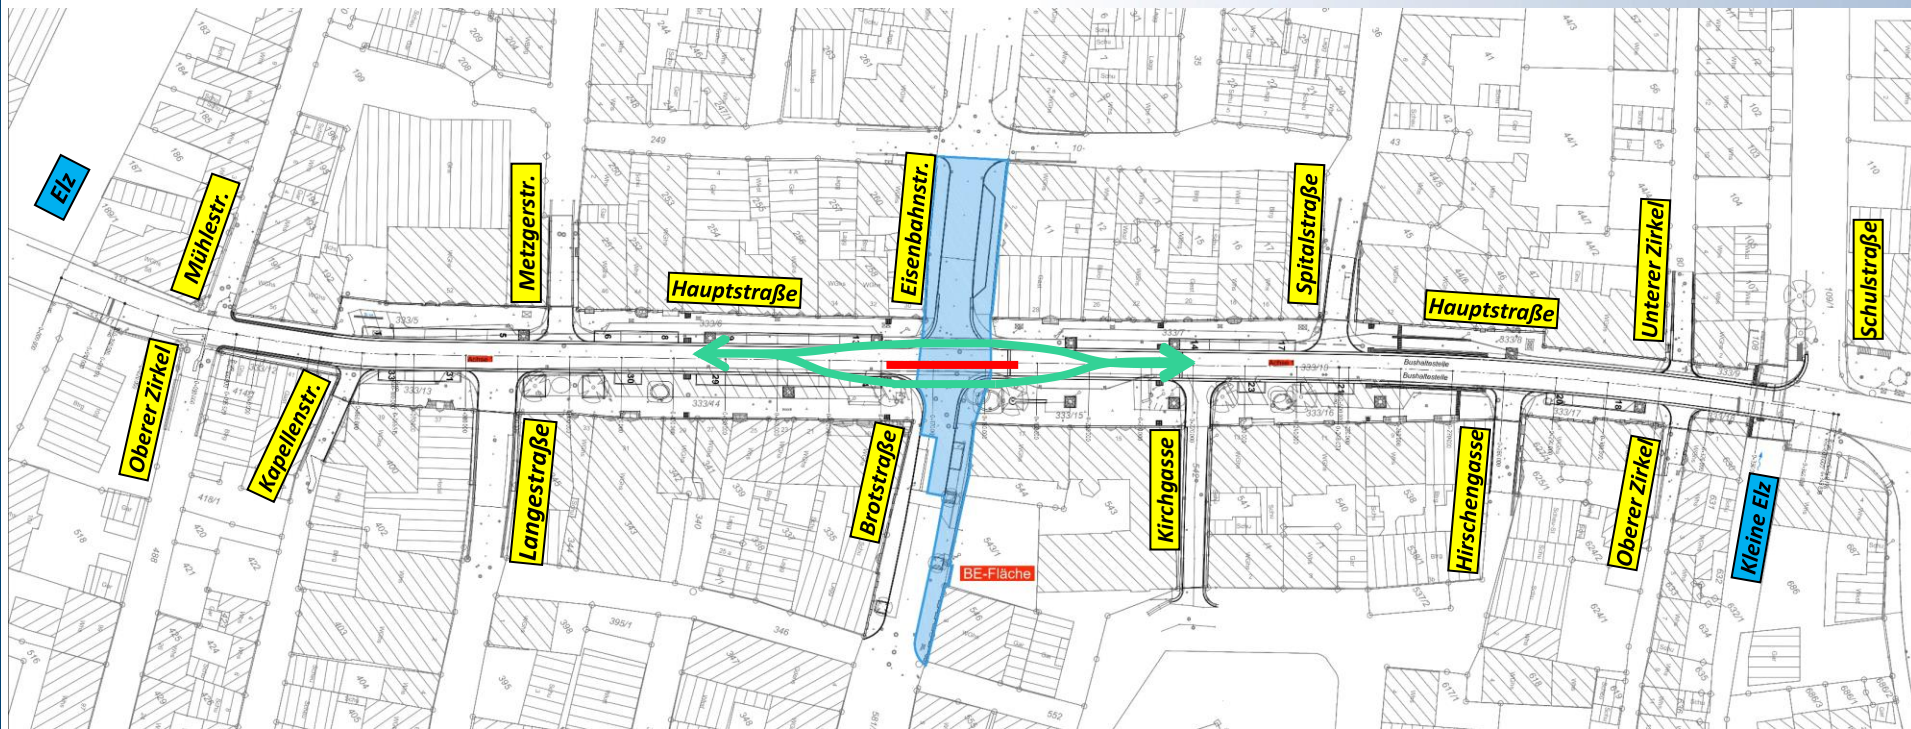


Bauabschnitt 3.1:

- Januar bis Anfang März 2020 - Sperrung Eisenbahnstr. bis Anfang März 2020
Hauptstraße befahrbar (Baustelle halbseitig)
- Januar bis Anfang April 2020 - Sperrung Brotstraße
Hauptstraße befahrbar (Baustelle halbseitig)



Bauabschnitte

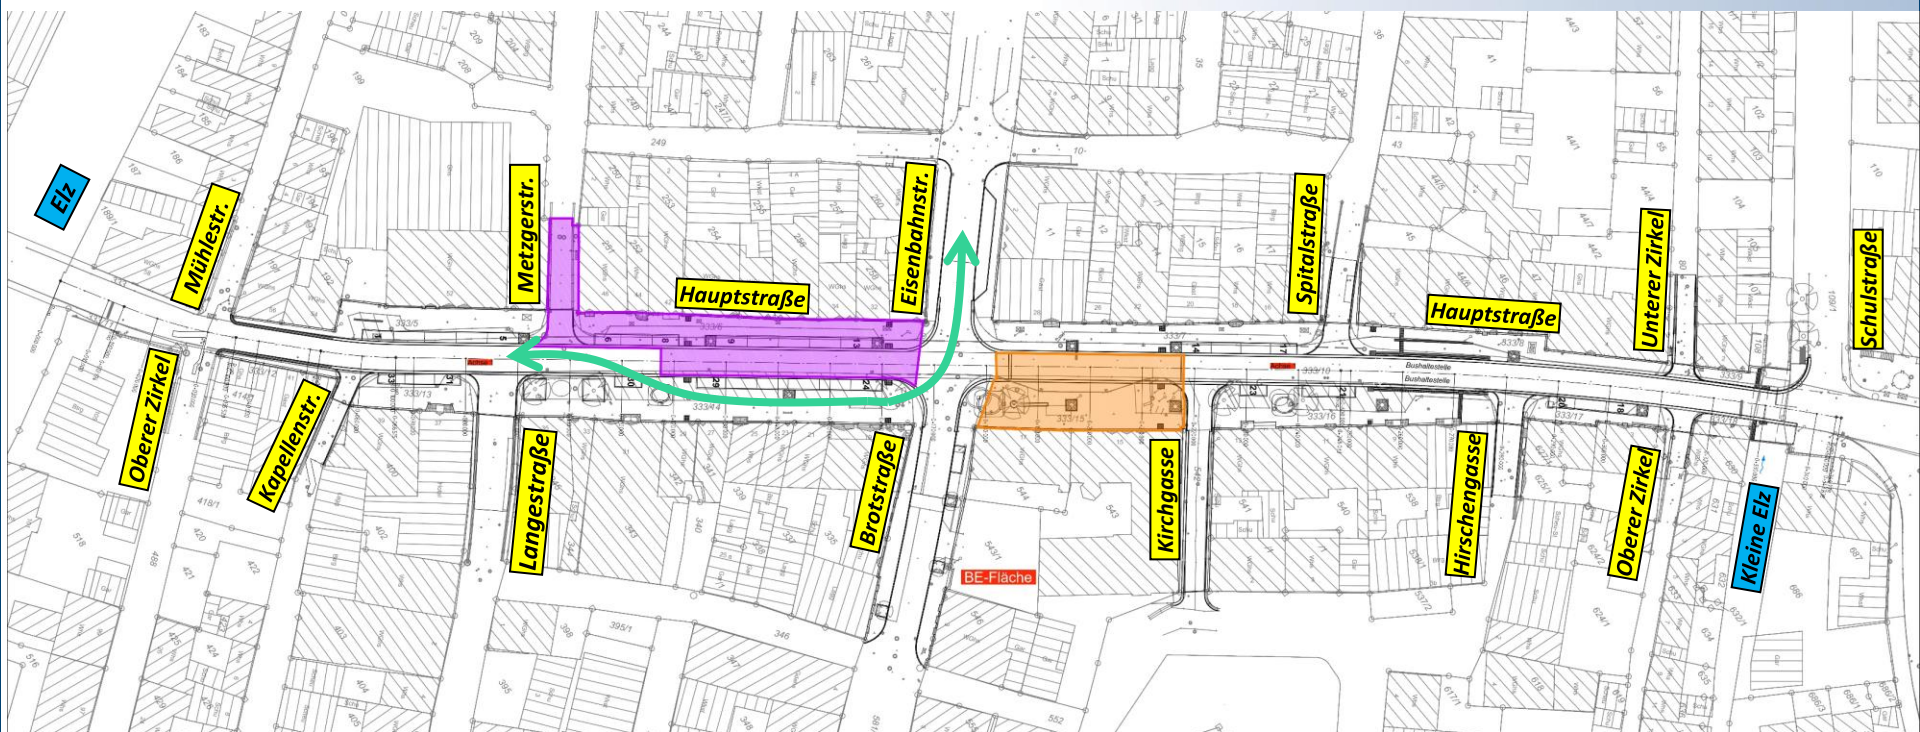

Bauabschnitt 3.2:


- Anfang April bis Anfang Juli 2020

Bauabschnitt 2.2:

- Anfang April bis Anfang Juni 2020



Bauabschnitte

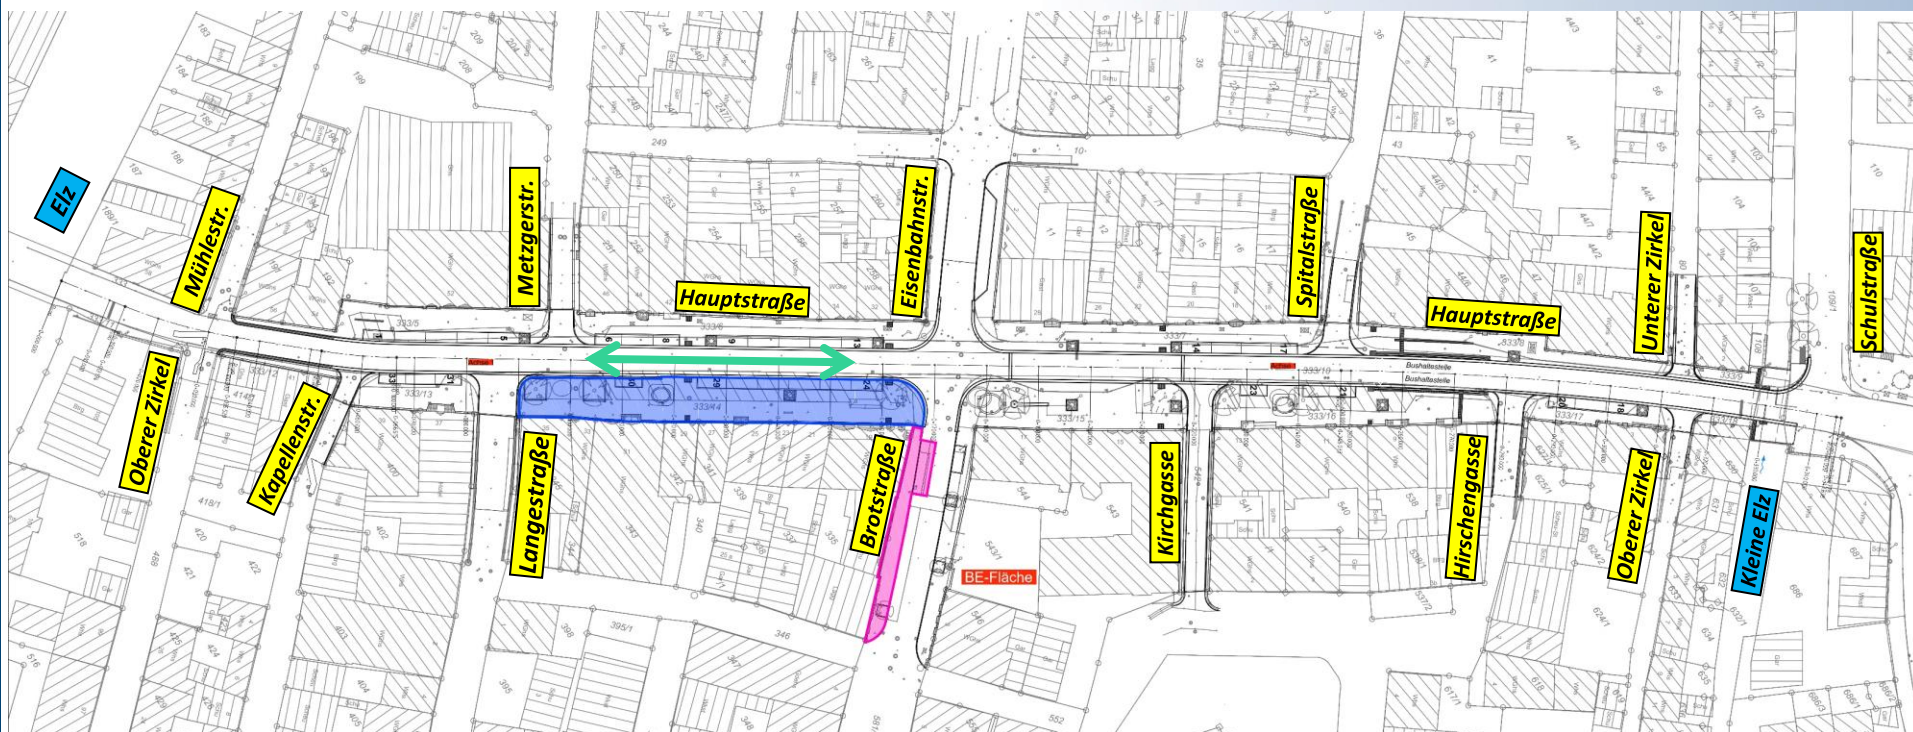

Bauabschnitt 3.3:


- Anfang Juli bis Anfang August 2020

Bauabschnitt 3.4:

- Ende Juli bis Anfang September 2020



Bauabschnitt 4.1

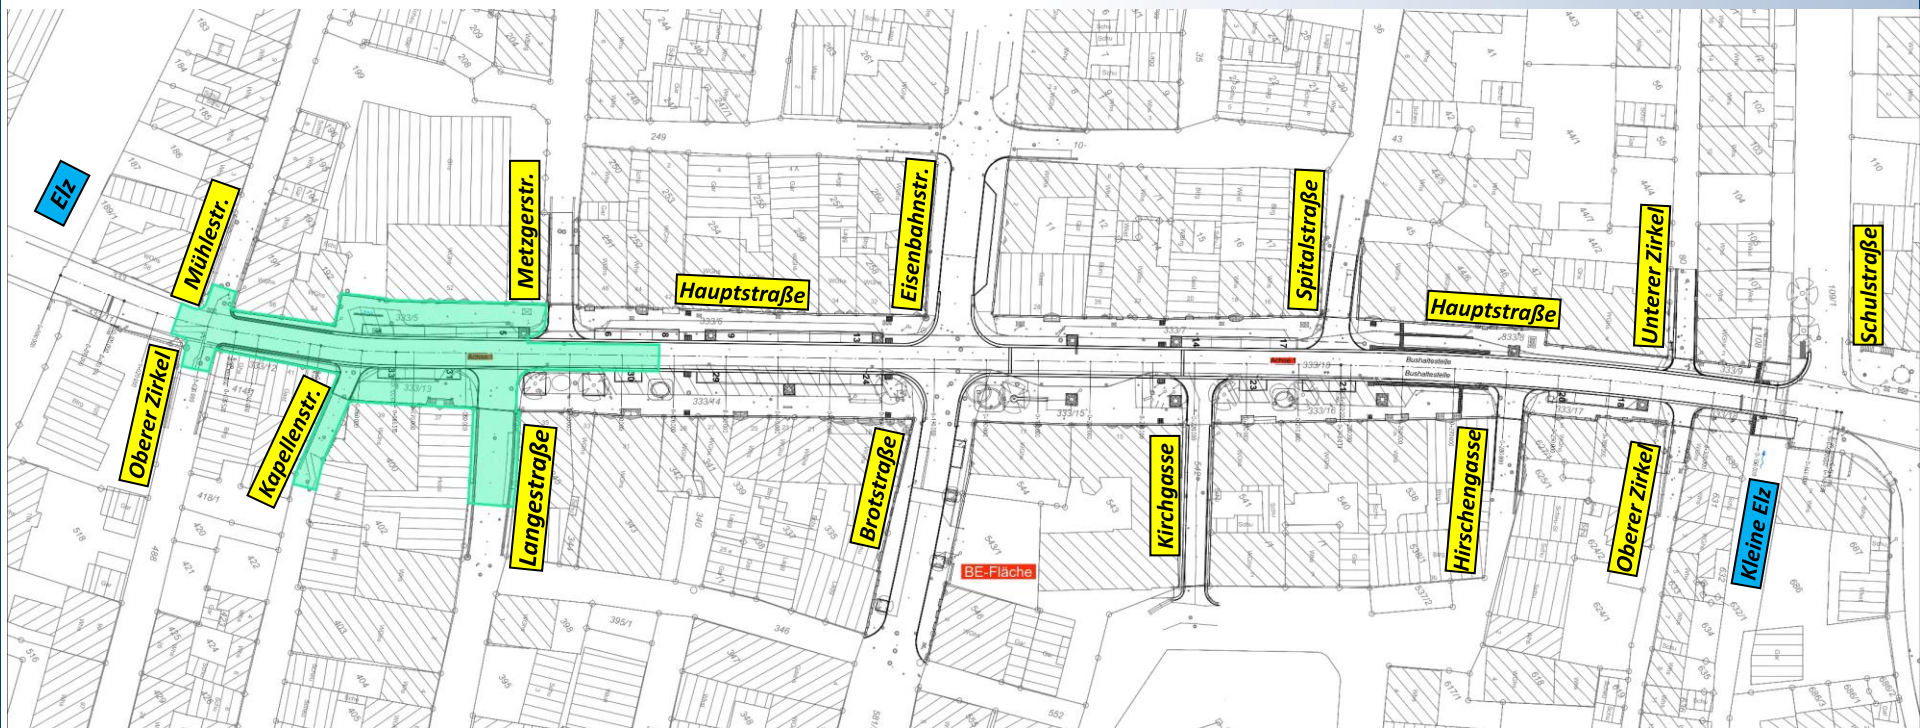


Bauabschnitt 4.1:

- Anfang August bis Ende November 2020
- Vollsperrung Innenstadt Anfang/ Mitte August – Anfang/ Mitte Oktober 2020 (ca. 8 Wochen)



Bauabschnitte

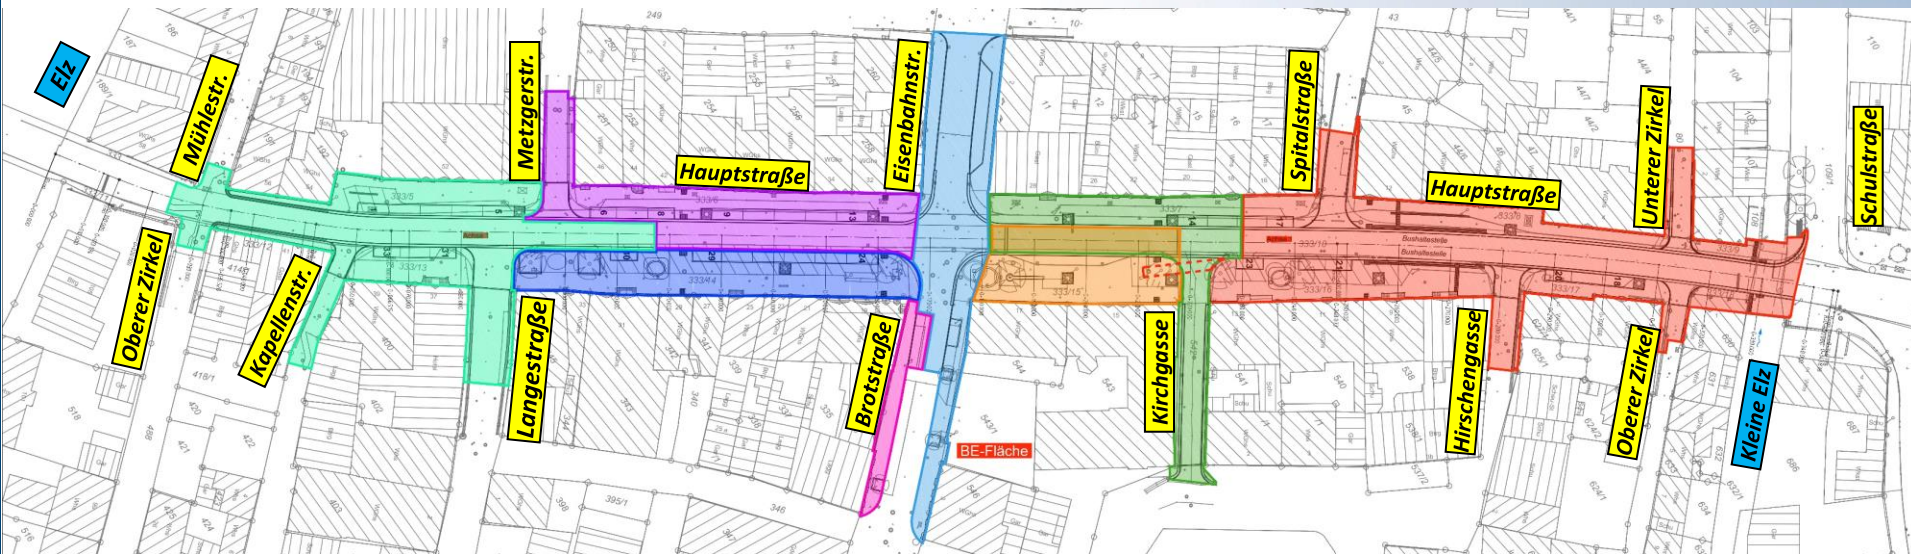

BA 1: Ende Mai - Ende September 2019

BA 2.1: Mitte September - Ende November 2019

BA 3.1: Anfang Januar - Anfang April 2020

BA 2.2: Anfang April - Anfang Juni 2020

BA 3.2: Anfang April - Anfang Juli 2020

BA 3.3: Anfang Juli - Anfang August 2020

BA 3.4: Ende Juli - Anfang September 2020

BA 4: Anfang August - Ende November 2020

Vollsperrung Innenstadt Anfang/ Mitte

August – Anfang/ Mitte Oktober 2020



Stadt Kenzingen

Umgestaltung der Hauptstraße



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
